Schedule

Project ID: Sussex County

Description: Lochwood Sewer Expansion
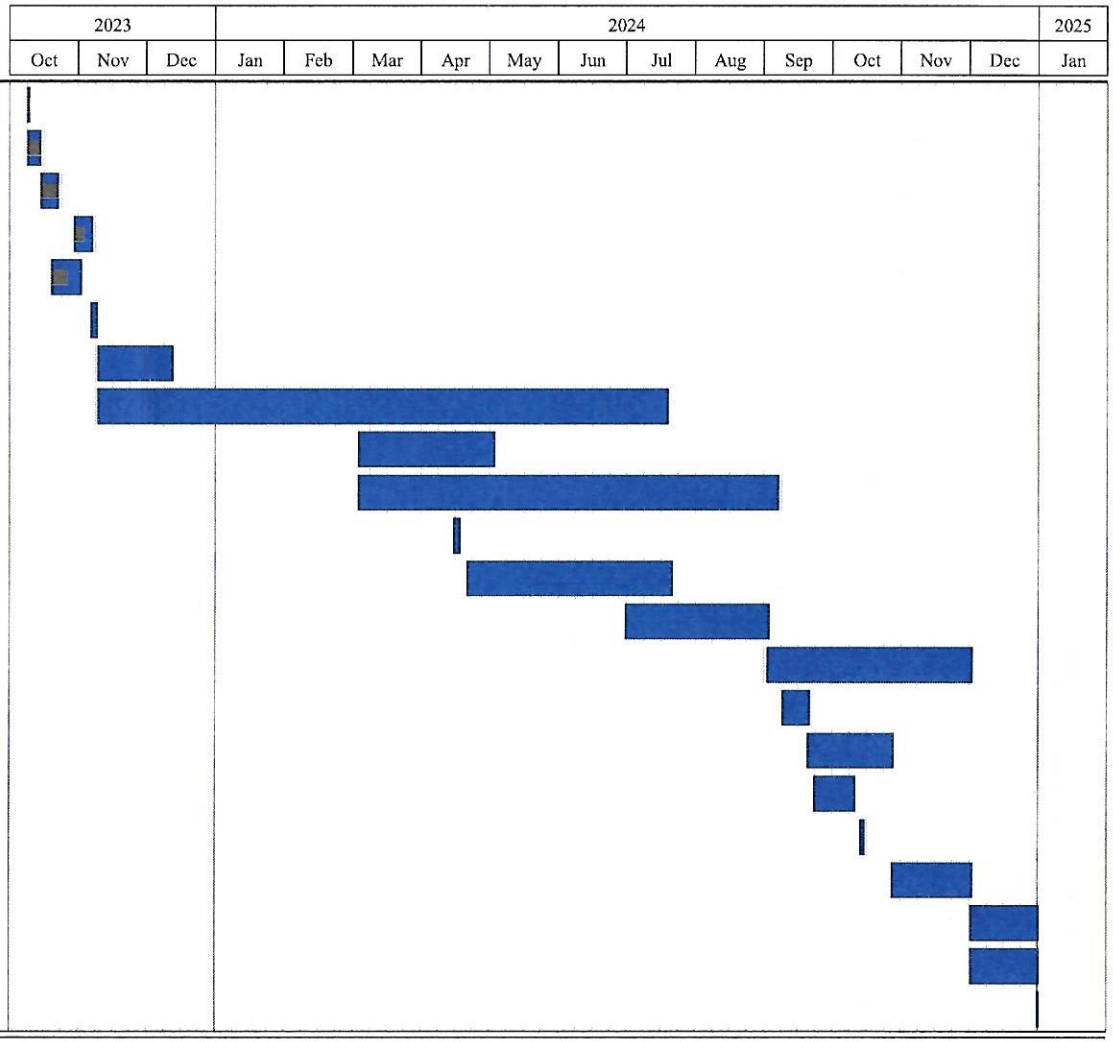
Num	Task Title	% Comp	Start	Finish
1	Notice to Proceed	100	10/9/2023	10/9/2023
2	Directional Drill 6" FM	100	10/9/2023	10/14/2023
3	Temporary Shut Down	100	10/15/2023	10/22/2023
4	Mobilization	50	10/30/2023	11/6/2023
5	Clearing & Erosion Control "Station"	50	10/20/2023	11/1/2023
6	Excavation for Vacuum Station	0	11/6/2023	11/8/2023
7	Vacuum Station Foundation Work	0	11/9/2023	12/12/2023
8	Vacuum Sewer Main 4"/6"/8"	0	11/9/2023	7/19/2024
9	Force Main Construction	0	3/4/2024	5/3/2024
10	3" Vacuum Line/Airvac Pit/4" Gravity	0	3/4/2024	9/6/2024
11	Set Vacuum Station Tank/Pumps	0	4/15/2024	4/17/2024
12	Vacuum Station Building Shell	0	4/21/2024	7/21/2024
13	Vacuum Station Mechanical Work	0	7/1/2024	9/2/2024
14	Vacuum Station Electrical Work	0	9/2/2024	12/2/2024
15	Prepping for Surface Paving/Restoration	0	9/9/2024	9/20/2024
16	Sitework for Vacuum Station	0	9/20/2024	10/28/2024
17	Surface Pavement for Neighborhood	0	9/23/2024	10/11/2024
18	Paving Vacuum Station	0	10/14/2024	10/15/2024
19	Cleanup/Restoration	0	10/28/2024	12/2/2024
20	Substantial Completion	0	12/2/2024	1/1/2025
21	Punchlist	0	12/2/2024	1/1/2025
22	Final Completion	0	1/1/2025	1/1/2025
